

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду*

для водоснабжения населения д. Ясачная Хайрюзовка Усть-Удинского района Иркутской области.
2013г.

Общие данные

1. Местоположение скважины - РФ, Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Ясачная Хайрюзовка, ул. Горная, 5

Элемент рельефа: правый склон долины реки Хайрюзовка

Расстояние от скважины до объекта водоснабжения : 0 км

2. Скважина пробурена на основании : --

(наименование и дата выдачи технического задания заказчика, сведения об организации заказчика, наименования и даты документов о согласии места проходки и выбора точки заложения скважины)

Исполнитель работ : ---

(название организации и ее подразделения, производившего бурение скважины,

3. Абсолютная отметка устья скважины ---м. Координаты или привязка скважины (к местной ситуации): Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Ясачная Хайрюзовка, ул. Горная, 5

Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) _____ км.

4. Начало бурения _____ 1970г _____ Окончание бурения _____ 1970г _____

(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

5. Способ бурения скважины : вращательный

(ударно-механический, вращательный, тип станка)

Машинист буровой установки ---

Конструкция скважины и фильтра

6. Общая глубина скважины от поверхности земли 75,0 м.

Колонна обсадных труб диаметром 273 мм от 0 до 10,5 м

То же 168мм от 0 до 75,0м

Превышение колонны труб над устьем скважины: 0,5м; 273мм

(величина, диаметр)

7. Фильтровая колонна диаметром 168 мм и длиной 75 м

установлена на глубине от 0 до 75,0 м и состоит: верхняя глухая часть длиной 63,0 м. Рабочая часть фильтра длиной 8,0м; отстойник длиной 4,0м; фильтр щелевой, скважностью 20%. Щели размером 1,5 на 30см. В проволочной обмотке.

Рабочая часть фильтра установлена на глубине от 63,0-71,0

8. Цементирование скважины произведено в интервале 0-10,5м.

9. Дополнительные данные _____

(установка сальников, извлечение лишних колонн обсадных труб, каротажные геофизические работы, выполненные в скважине, глубина отбора проб пород и воды, результаты анализа и др.)

Данные опытной откачки воды из скважины

10. Откачка начата 18.12.2013 _____ Откачка закончена 21.12.2013 _____

(число, месяц)

(число, месяц)

Продолжительность откачки: 72 ч (6 смен).

11. Водоподъемное оборудование, использованное при откачке : эрлифт, 51м

(тип, марка насоса, его параметры глубина погружения приемной части насоса или смесителя эрлифта и др.)

12. Устройство для измерения дебита скважины : емкость 200 л.

13. Измерения уровня воды производилась: электроуровнемером УСК-ТЭ-150

(тип и марка устройства)

Статический уровень воды в скважине перед началом откачки (от нулевой точки) : 10,5 м

14. Результаты опытной откачки из скважины:

Степень опыта

Динамический уровень: 18,7

Дебит, 144 м³/сут:

Понижение уровня, м : 8,2

Удельный дебит, м³/сут/м- 17,56

Количество часов на заданной ступени: 72

Полное осветление воды после начала откачки достигнуто через 3ч 20 мин.

Статический уровень после откачки восстановился через 4ч 30 мин на глубине 10,5 м от нулевой точки.

Начальник УДР БФ «Сосновгеология» Копылов А.Н.



Гидрогеолог 1 кат. БФ «Сосновгеология» Соловьева Е.В.


**Паспорт составлен на основании результатов обследования скважины ФГУП «Урангео» БФ «Сосновгеология» в декабре 2013г. и фондовым материалам (Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Иркутской области. Том 2. Буровые на воду скважины. Книга 6. Москва 1976г)*

Паспорт составлен в соответствии с СП 11-108-98

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
скважины на воду.

Иркутская обл. Усть-Удинский район, д. Ясачная Хайрюзовка,
ул. Горная, 5

ФГУП «Урангео» БФ «Сосновгеология»

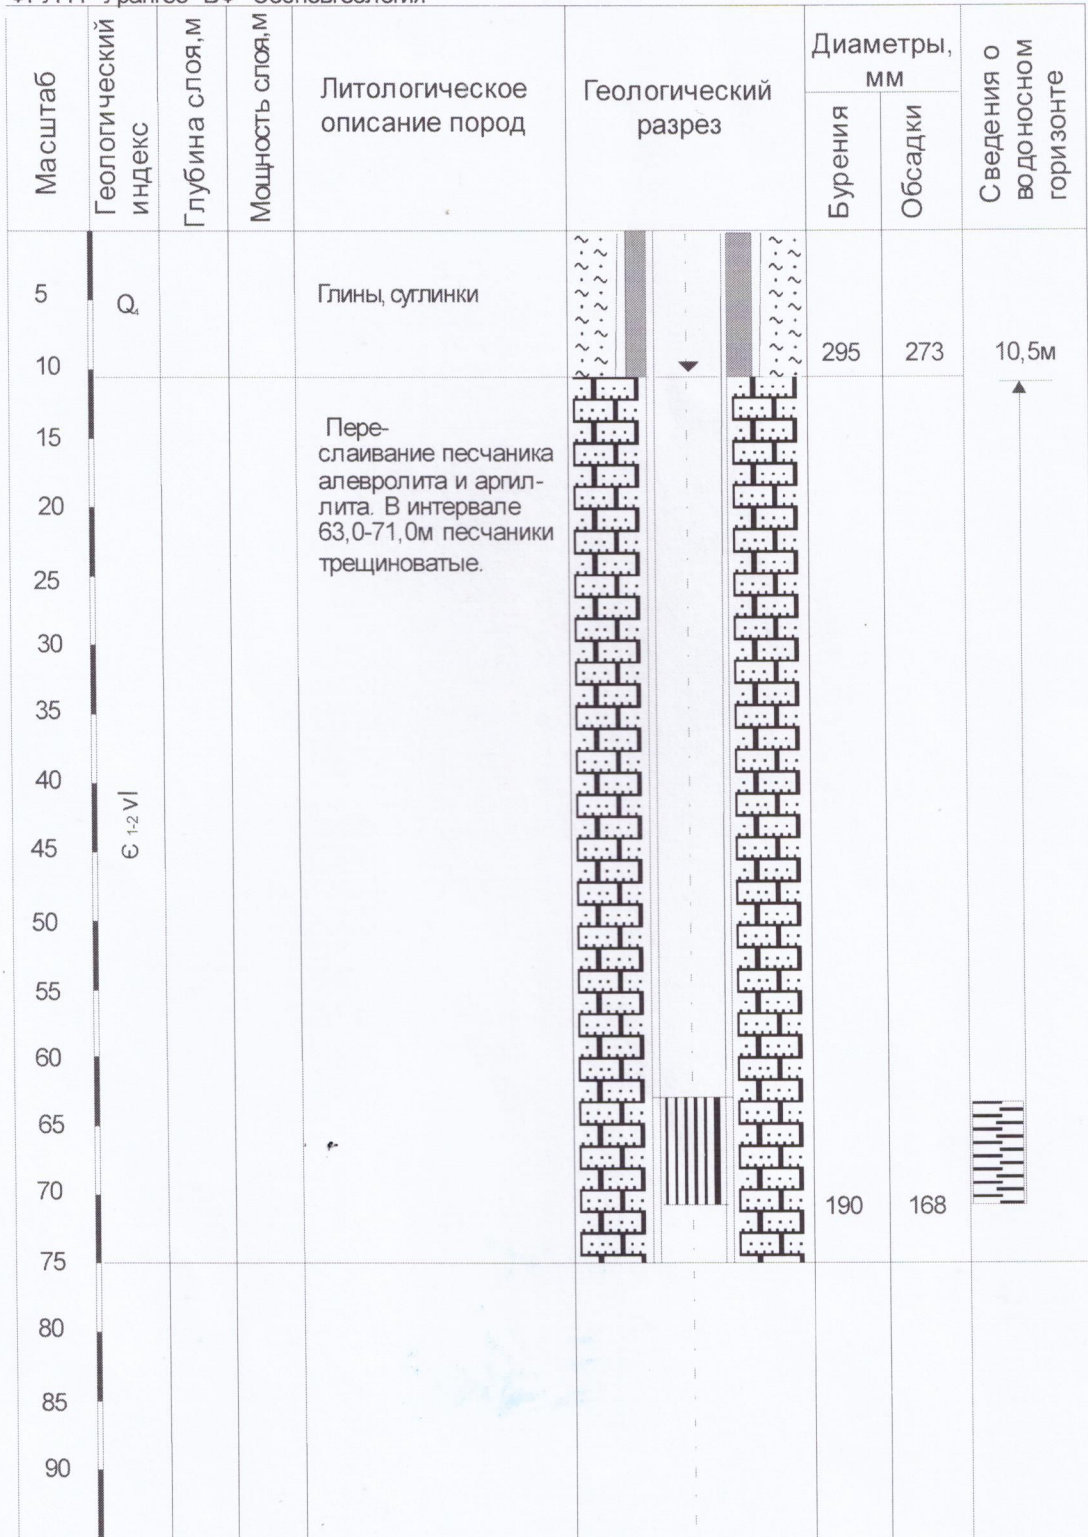

Глубина скважины: 75,0 м
Статический уровень: 10,5 м
Интервалы обводненных пород: 63,0-71,0 м.
Фильтр щелевой установлен в интервале 63,0-71,0 м
